

668/2014/C

2014 4 104. 616 2014



15-660 Białystok ul. W. Witosa 21/12
tel (085) 743-74-64
fax(085) 743-30-66
kom 0509 156 333
NIP:542-209-27-02

WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „ENRAC” Jerzy Racewicz

**PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I
ZABEZPIECZENIA PROWADZONYCH ROBÓT**

**NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I
WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM PRZY
UL. DREWNIANEJ DZ. NR 37, 125/1, 38/6 W BIAŁYMSTOKU**

OBIEKT: Przyłącze kan. sanitarnej, przyłącze wodociągowe

MIEJSCOWOŚĆ BIAŁYSTOK, ul. Drewniana dz. nr 37, 125/1, 38/6

INWESTOR: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH „ENRAC”
Jerzy Racewicz
15-660 Białystok, ul. W. Witosa 21/12
tel. 888 207 007

Białystok

OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu drogowego związanych z budową przyłącza kan. sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. Drewnianej dz. nr 37, 125/1, 38/6 w Białymstoku.

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót związanych z budową przyłącza kan. sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. Drewnianej dz. nr 37, 125/1, 38/6 w Białymstoku.

2. Podstawa opracowania

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (DZ.U.Nr.177 z dnia 14 października 2003r.)
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. z dnia 1 marca 1997 ze zmianami)
- c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1987 Prawo o ruchu drogowym (DZ.U. z dnia 19 sierpnia 1997r ze zmianami)
- d) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ.U.Nr.170 z dnia 12 października 2002)
- e) Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
- f) Wizja lokalna w terenie

3. Opis stanu istniejącego

Pas drogowy przy ul. Drewnianej dz. nr 37, 125/1, 38/6 w Białymstoku znajduje się pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Zarząd Dróg Miejskich. Pas drogowy składa się z jezdni o nawierzchni polbrukowej.

4. Organizacja ruchu i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

Prace polegające będą na budowie przyłącza kan. sanitarnej oraz wodociągowej w Białymstoku. W odległości ok 30m od robót umieszczone zostaną znaki drogowe A-14 ostrzegające o robotach drogowych, A-12b i A-12c informujące o jednostronnym zwężeniu drogi oraz A-30. Prace odbywać się będą w ulicy oraz chodniku. Podczas budowy sieci kan. sanitarnej ustawione zostaną zapory drogowe U-20a, U-20b oraz od strony chodnika U-20c. Przejścia pod ul. Kołodziejską wykonane zostaną metodą rozkopu połówkowego. Pozostałe przejścia wykonane zostaną metodami przecisku. W czasie prac ustawiane będą tablice prowadzące U-3d. Aby umożliwić przejście pieszym ustawiony zostanie kładki U-28. Znaki i tablice będą przestawiane wraz z postępem prac. Ustawienie znaków pokazano na mapach. Po zakończeniu prac należy miejsce robót doprowadzić do stanu poprzedniego.

Szkic graficzny zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przedstawiono na planszy sytuacyjno-wysokościowej.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- a) Ryzyko wypadków drogowych
- b) Ryzyko wpadnięcia do wykopu lub obsunięcia ziemi w wykopie


5. Uwagi ogólne

- a) na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca winien uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego, a po ich zakończeniu doprowadzić teren do stanu pierwotnego
- b) przewidywany termin wykonania prac: lipiec - grudzień 2017, a czas trwania w pasie drogowym ok. 3-5 dni/etap
- c) powierzchnia zajęcia pasa drogowego przy budowie przyłączy zaznaczono na mapie

ZATWIERDZAM Z UWAGAMI BEZ UWAG
 STAŁA CZASOWA ORGANIZACJĘ RUCHU
 dot. etapów 1-3
 W pasie drogowym ul. Drewniana
 w Białymstoku. Termin w którym powinna zostać wprowadzona
 zatwierdzona organizacja ruchu 31 XII 2017
 Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana
 jest zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi
 oraz właściwego Komendanta Policji o terminie wprowadzenia
 organizacji ruchu co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia
 Białystok, dnia

Wojciech
 [Red stamp: Kierownik Komendy Powiatowej Policji w Białymstoku]

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwających robót zapewnić dojazd do posesji min 2,5m
 Bariery i znaki drogowe będą przestawiane odpowiednio do etapów robót

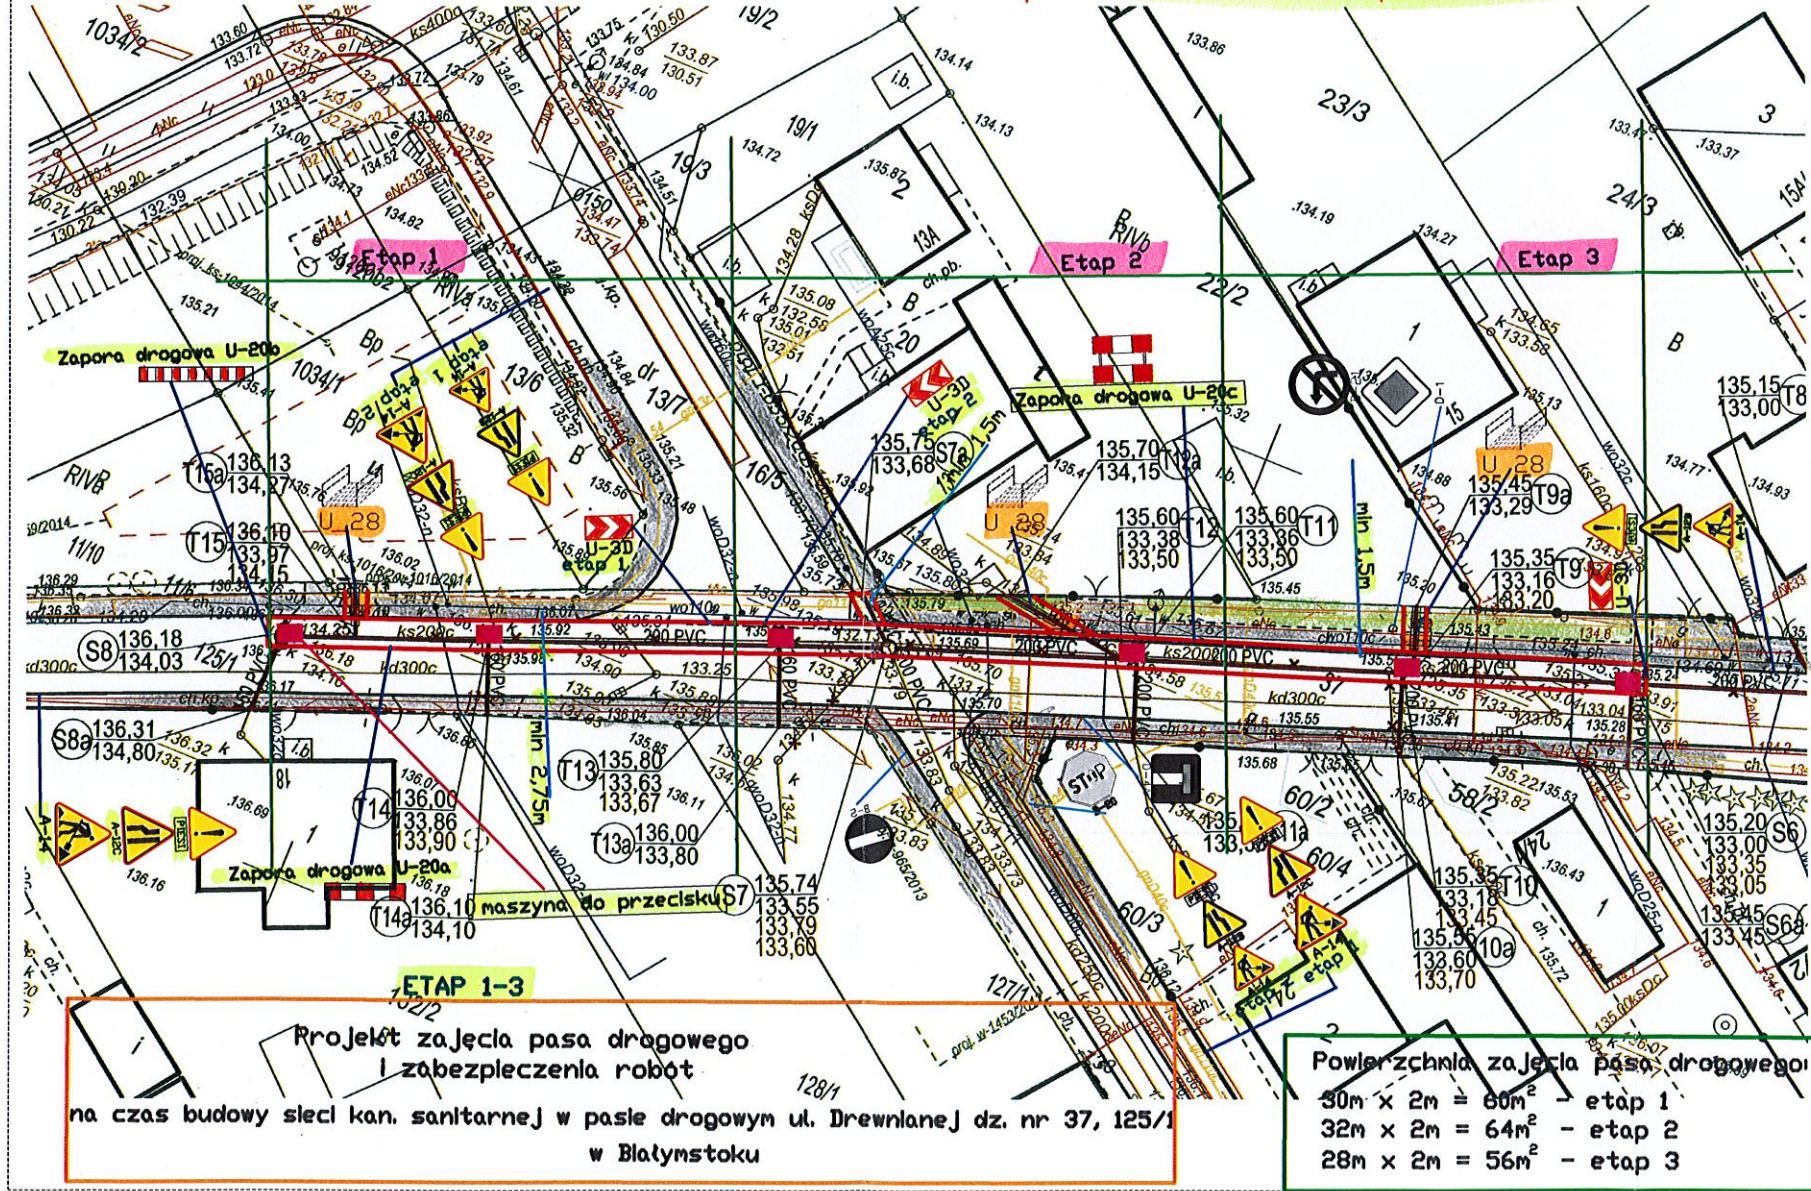

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwających robót
zapewnić dojazdy do posesji min 2,5m

Bariery i znaki drogowe będą przedstawiane
odpowiednio do etapów robót

